ID	Description	Original Duration	Start	Finish
Summit County Fairgrounds				
10	NTP	0	10/23/17A	
20	Mobilize onsite	1	10/23/17A	10/23/17A
30	Pre-Con Meeting	1	10/24/17A	10/24/17A
35	Permit Issued	1	11/03/17A	11/03/17A
40	Substantial Completion	0		07/23/18
50	Puchlist	10	07/24/18	08/06/18
60	Completion	0		08/06/18
Site				
70	Demo	10	04/02/18	04/13/18
80	Utilities	10	04/16/18	04/27/18
90	Curb and Gutter	10	04/30/18	05/11/18
100	Paving	10	05/14/18	05/25/18
Agricultural Buildings				
110	Grading	15	11/29/17A	12/19/17A
120	Footings & Foundations	10	03/01/18	03/14/18
130	Metal Buildings Onsite	1	01/15/18A	01/15/18A
140	Stand Metal Buildings	60	03/15/18	06/06/18
150	Concrete floor in bowery	5	06/07/18	06/13/18
160	MEPs in Metal Buildings	10	06/14/18	06/27/18
170	Under ground utilities	5	06/28/18	07/04/18
180	Paving	10	07/05/18	07/18/18
Community Center				
190	Grading	15	11/08/17A	11/28/17A
195	Move Gas Line	5	11/06/17A	11/10/17A
200	Footings and foundations	35	11/22/17A	01/09/18A
210	Underground Utilities	20	12/13/17A	01/11/18A
220	Grading for floor	5	01/08/18A	01/12/18A
230	Pour floor	5	01/15/18A	01/19/18A
240	Stand steel	7	01/29/18A	02/09/18
250	Exterior Framing	25	02/06/18	03/12/18
260	Exterior Moisture Barrier	10	03/13/18	03/26/18
270	Roofing	10	03/13/18	03/26/18
280	Interior framing	30	03/06/18	04/16/18
290	Electrical	20	03/27/18	04/23/18
300	Plumbing	20	03/27/18	04/23/18
310	Mechanical	15	03/27/18	04/16/18
320	Windows & Storefronts	15	03/27/18	04/16/18
330	Exterior Insulation & Finishes	35	04/10/18	05/28/18
340	Sheetrock	20	04/17/18	05/14/18
350	Taping	15	05/08/18	05/28/18
360	Painting	15	05/29/18	06/18/18
370	Ceiling Finishes	15	06/05/18	06/25/18
380	Floor finishes	20	06/26/18	07/23/18
390	Electrical Finishes	20	06/12/18	07/09/18
400	Plumbing Finishes	15	06/26/18	07/16/18
410	Mechanical Finishes	15	07/03/18	07/23/18

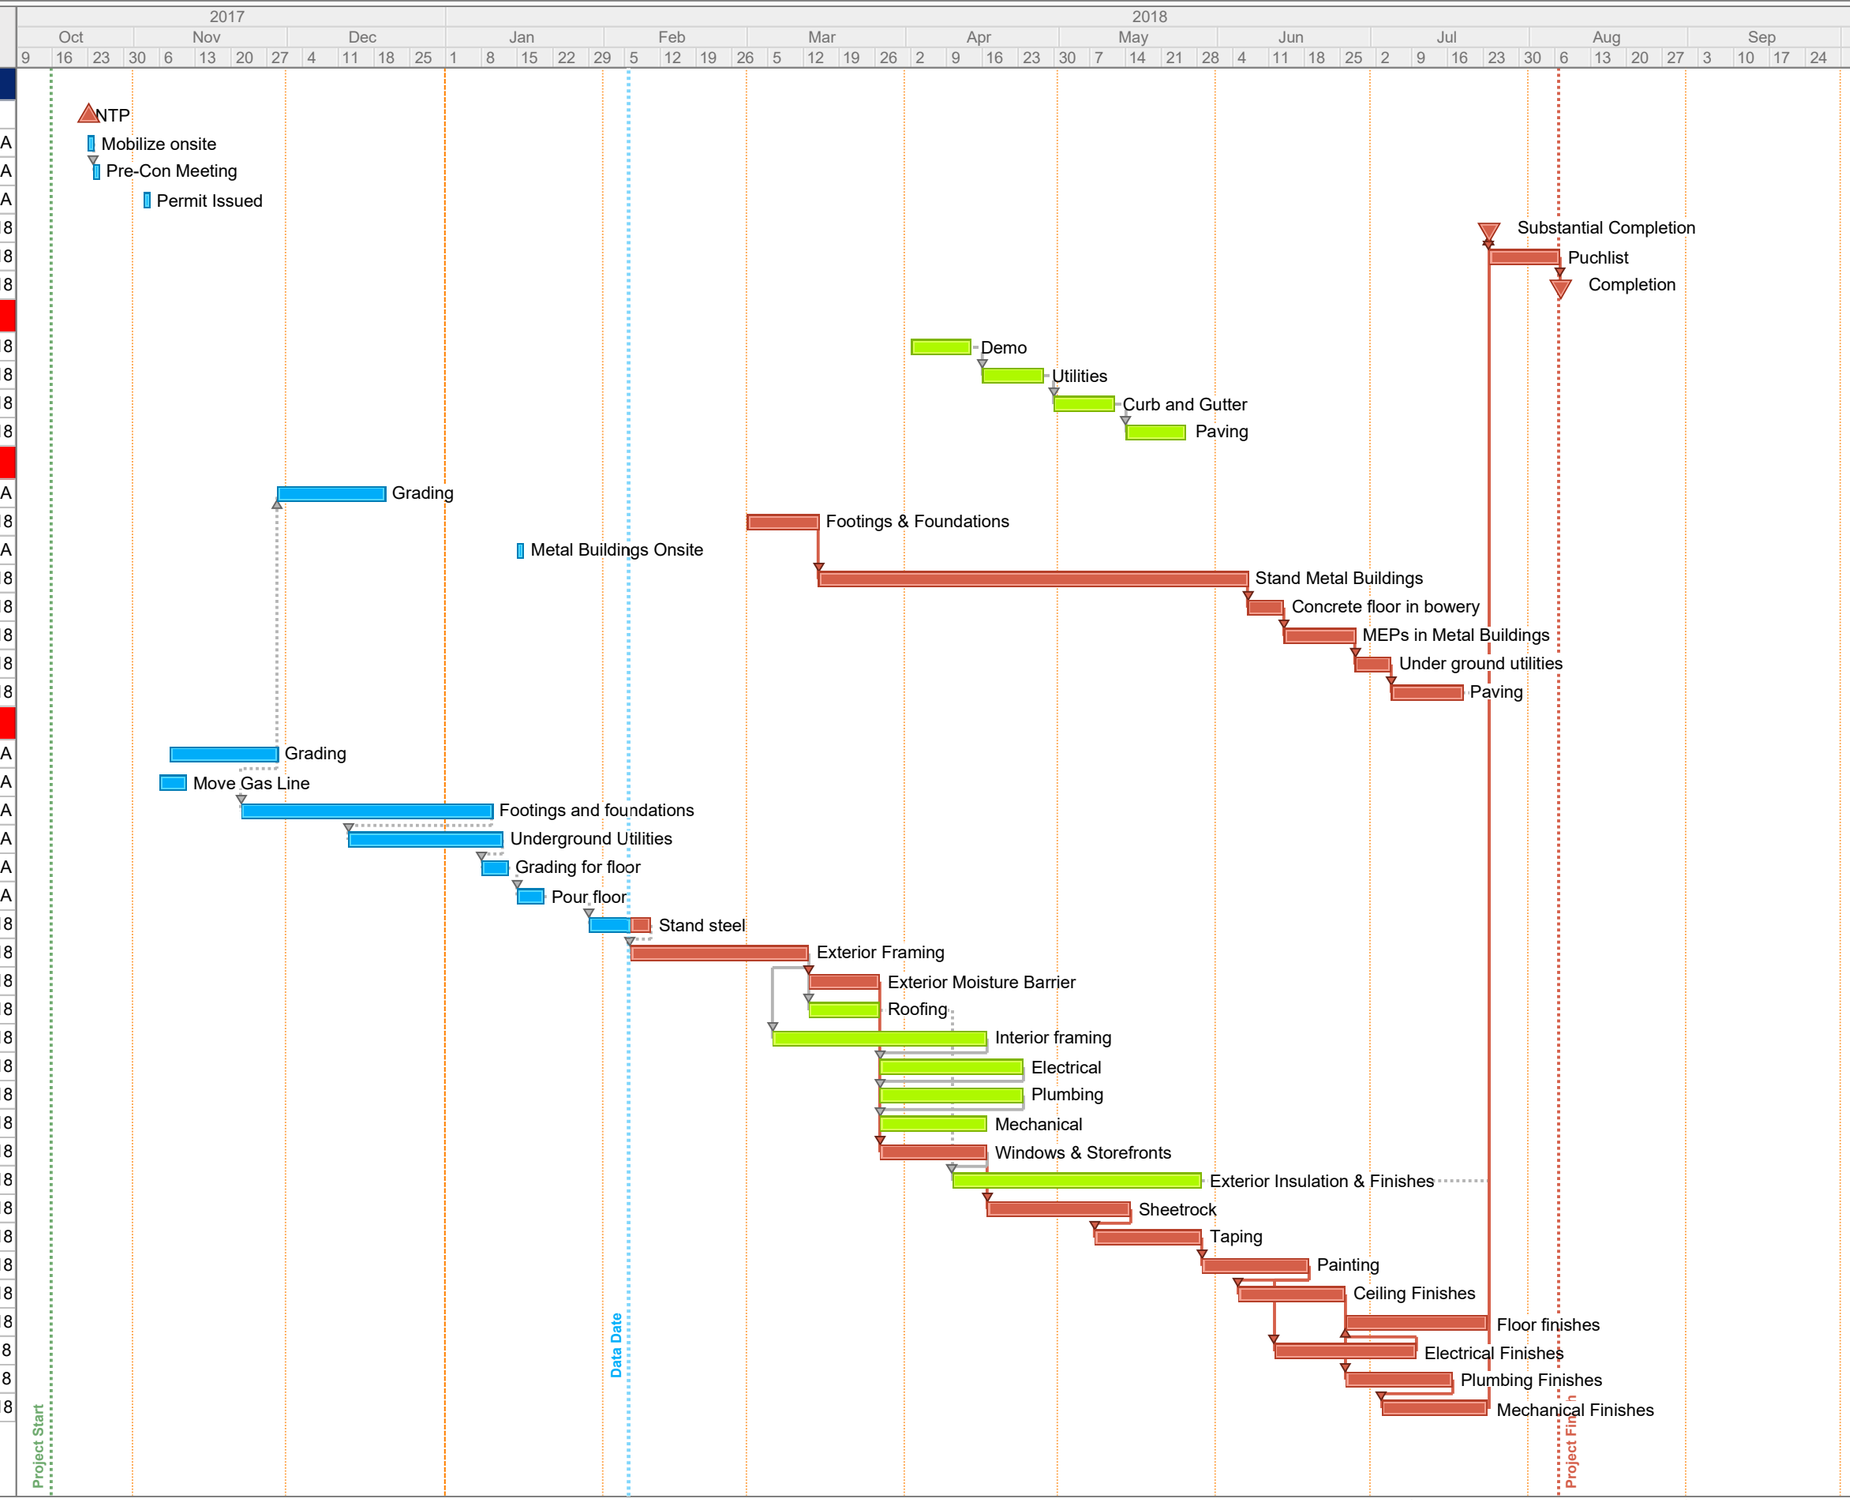

Start Date: 10/16/17
Finish Date: 08/06/18
Data Date: 02/06/18
Run Date: 02/07/18

Summit County Community Center
